



IMPLEMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA · DOCUMENTO 01 DE 05

Plan de implementación

Cronograma, fases, ruta crítica y alcance diferido de la puesta en marcha de ARIA en la Universidad de Piura

EN ESTE DOCUMENTO

1. Qué se está implementando y qué no
2. Supuestos del cronograma
3. Cronograma (Gantt)
4. Detalle por fase
5. Ruta crítica
6. Alcance diferido (acordado fuera de esta implementación)
7. Documentos relacionados

LA SERIE COMPLETA

- 01 Plan de implementación**
- 02 Matriz de riesgos
- 03 Análisis de brechas
- 04 Plan de pruebas y aceptación
- 05 Acta de compromisos

1. Qué se está implementando y qué no

La distinción es importante para leer el cronograma sin sorpresas.

Ya construido y verificado (no consume tiempo del plan): el modelo de Programa, el ledger de golpes, el motor de supresión, la salud del número de WhatsApp, la ingesta nativa de leads de Meta, el inbox omnicanal, la orquestación del dialer, el Agente IA con RAG, el set de reportes y el mapeo schema-aware de Salesforce.

Lo que sí consume tiempo del plan: conseguir los accesos y credenciales que solo UDEP puede entregar, cargar la configuración real (programas, plantillas, usuarios, taxonomía), probar de punta a punta contra los sistemas reales de UDEP, capacitar a los asesores y acompañar el arranque.


Dicho de otro modo: **el riesgo del proyecto no es técnico, es de coordinación.** Seis de los siete caminos críticos del cronograma dependen de una acción de UDEP, no de Novasys. Por eso el documento **documento 05 · Acta de compromisos** es el que realmente gobierna la fecha de go-live.

2. Supuestos del cronograma

Si alguno de estos supuestos no se cumple, la fecha se mueve. Están listados para poder discutirlos antes de firmar, no después.

#	Supuesto	Si no se cumple
S1	UDEP designa un responsable técnico con capacidad de decisión y ~4 h/semana disponibles	El plan se alarga proporcionalmente a la latencia de respuesta
S2	El sandbox de Salesforce está disponible desde el 31 de julio	F3 no puede empezar; se corre todo el bloque de integración
S3	Los campos <code>Vox*__c</code> se crean en Salesforce antes del 14 de agosto	El write-back de golpes queda inactivo (degrada con gracia, pero R4 no se demuestra)
S4	El número Meta +51 908 825 660 queda operativo antes del 21 de agosto	No hay estado de entrega por mensaje; el reporte de deliverability queda parcial
S5	UDEP asigna 3–5 asesores reales para el UAT, con dedicación de media jornada durante 2 semanas	El UAT se hace con datos sintéticos y el riesgo se traslada al go-live
S6	El 28 y 29 de julio (Fiestas Patrias) no son días hábiles	Ya considerado en el cronograma
S7	El aprobado de plantillas de Meta demora 48–72 h	Ya considerado; si Meta rechaza, cada reintento suma 2–3 días

3. Cronograma (Gantt)

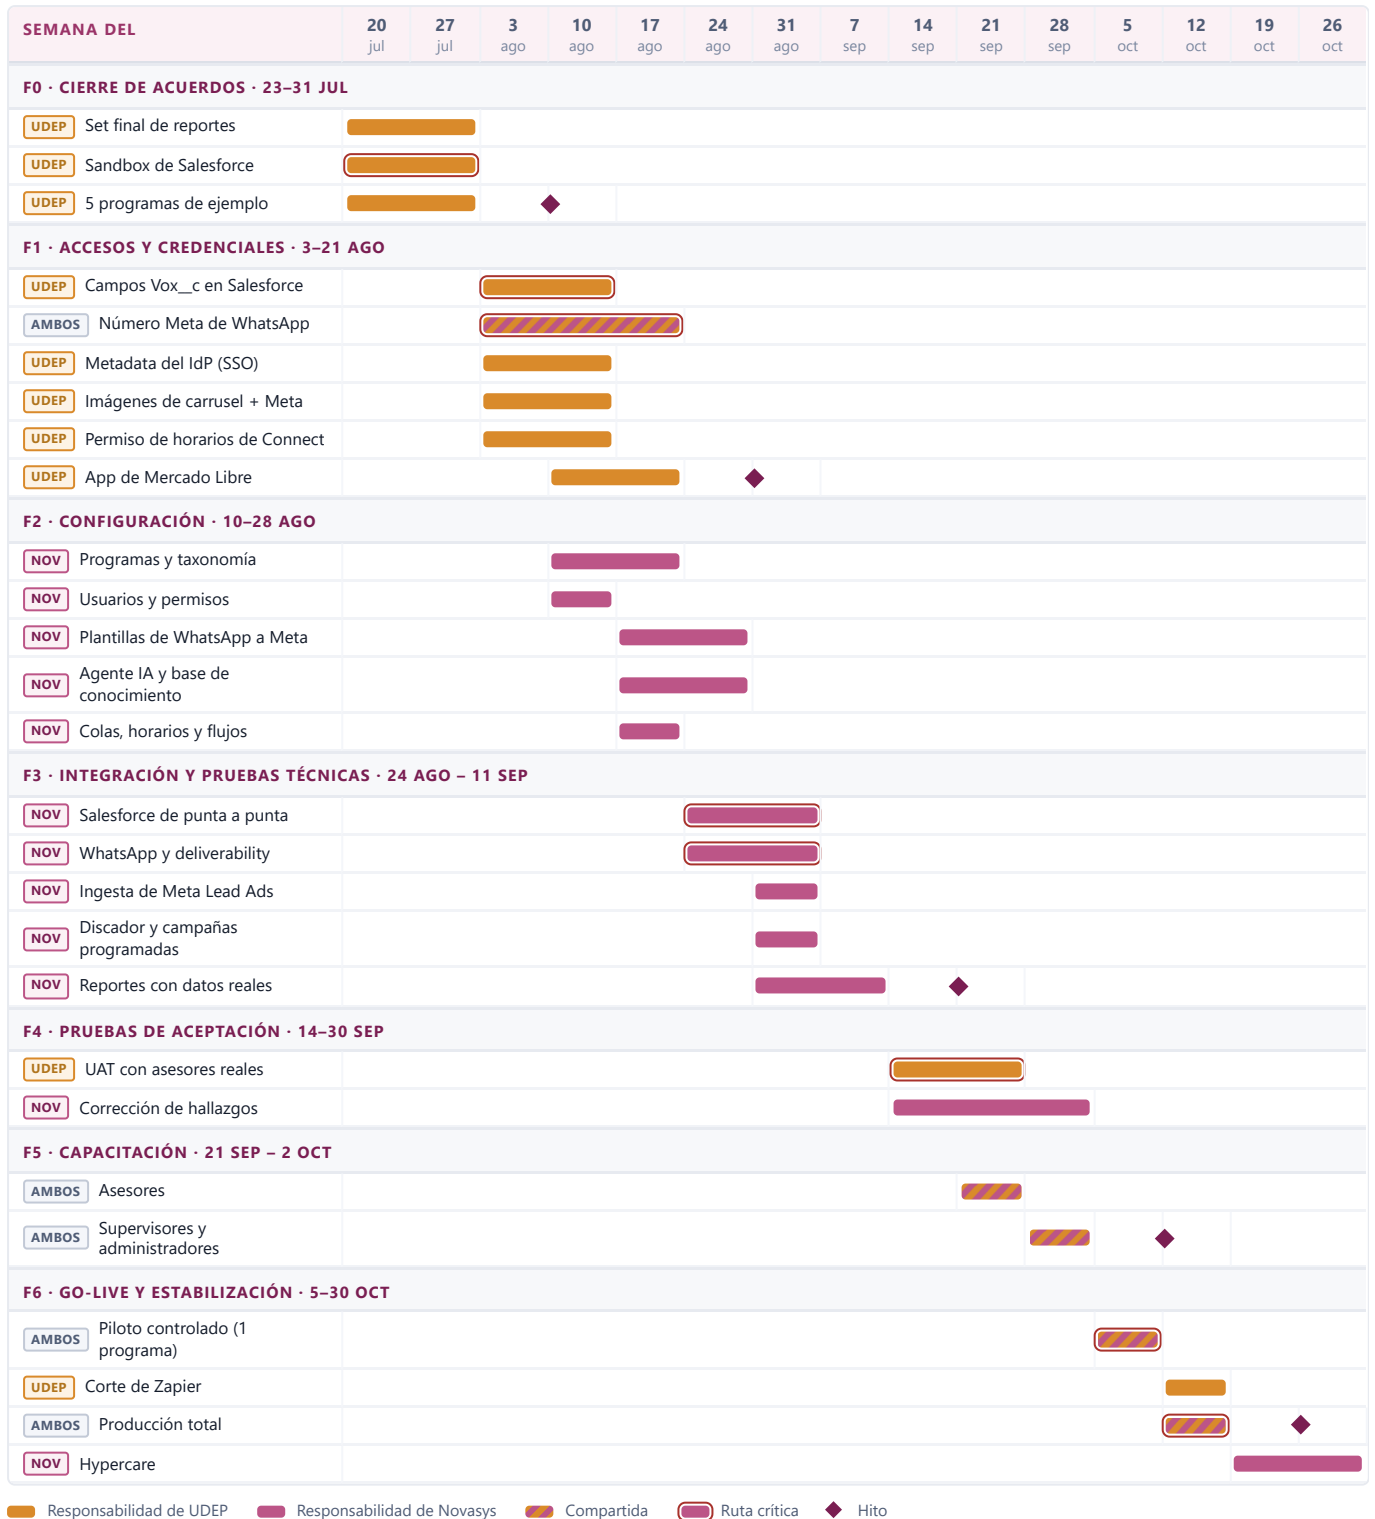

4. Detalle por fase

F0 · Cierre de acuerdos — 23 al 31 de julio

Es la fase más corta y la más determinante: fija quién entrega qué y cuándo.

Actividad	Responsable	Entregable
Firmar el acta de compromisos con fechas y responsables	Zhenia Loyola (UDEP) + Miguel Vega (Novasys)	Acta firmada
Sesión con Adriana Gómez para cerrar el set final de reportes (R20 , hoy abierto)	Adriana Gómez + Andre Alata	Lista firmada de reportes y campos
Solicitar el Developer Sandbox de Salesforce y accesos de admin	Carlos Olortiga / Julio (UDEP)	Credenciales entregadas
Enviar 5 programas de ejemplo y el layout programa ↔ cursos	Zhenia Loyola	Archivo de ejemplo
Enviar capturas de los formularios de Meta Lead Ads en uso	Adriana Gómez	Capturas

Criterio de salida: acta firmada y sandbox de Salesforce accesible.

F1 · Accesos y credenciales — 3 al 21 de agosto

Todo lo de esta fase lo ejecuta UDEP. Novasys acompaña con guías paso a paso, ya escritas.

Actividad	Responsable	Guía	Bloquea
Crear 7 campos custom <code>Vox*__c</code> en el objeto Lead	Admin Salesforce UDEP	design/go-live-runbook.md §2	Write-back de golpes (R4)
Conectar el número Meta +51 908 825 660 en modo standalone	Juan Gallardo + Novasys	design/go-live-runbook.md §1	Estado de entrega (R5)
Entregar metadata SAML o credenciales OIDC del IdP	IT UDEP	design/sso-setup-udep.md	Login federado
Crear la App de Mercado Libre y entregar app_id/secret	UDEP	design/go-live-runbook.md §4	Canal Mercado Libre
Entregar 2–3 imágenes por tarjeta de carrusel	Marketing UDEP	design/go-live-runbook.md §5	Plantillas de carrusel

Criterio de salida: los cinco accesos entregados, o decisión explícita y documentada de dejar alguno fuera del alcance de esta fase.

Ventana coordinada requerida. Repuntar el webhook de WhatsApp es disruptivo: durante el cambio, los mensajes entrantes pueden perderse. Debe hacerse fuera del horario de atención y con aviso previo a los asesores.

F2 · Configuración — 10 al 28 de agosto

Novasys ejecuta, UDEP valida.

- Carga de los ~56 programas activos con su taxonomía de estados y el mapeo a las unidades de Chattigo (`Humanidades_UDEPP` , `Medicina_UDEPP` , `Idiomas_UDEPP` , `Derecho_UDEPP` , `CCEE_UDEPP` , `Ingeniería_UDEPP` , `Posgrado_UP`).
- Alta de usuarios, asignación de roles y ajuste de la matriz de permisos por rol.
- Plantillas de WhatsApp con la convención de UDEP (`fecha_códigoPrograma_base`) enviadas a aprobación de Meta.
- Configuración del Agente IA: base de conocimiento, guardrails y umbral de confianza para derivar a humano.
- Colas de Amazon Connect, horarios de atención y perfiles de ruteo.

Criterio de salida: un asesor puede entrar, ver su cola, atender una conversación de prueba y tipificarla.

F3 · Integración y pruebas técnicas — 24 de agosto al 11 de septiembre

Aquí se prueba contra los sistemas reales de UDEP, no contra mocks.

Prueba	Qué demuestra	Requisito previo
Sincronización bidireccional con el sandbox de Salesforce	R23, R24 — el lead entra, se actualiza y no se duplica	Sandbox + campos creados
Golpes escritos en Vox*__c	R4 — atribución de golpes a conversión	Campos creados
Envío de HSM con estado delivered/read	R5 — deliverability real	Número Meta conectado
Lead de Meta Lead Ads → WhatsApp automático	R12 — Zapier reemplazado	Formularios conectados
Campaña programada que arranca sola dentro de su horario	Programación con fecha y hora (nuevo)	Configuración cargada
Reportes con datos reales de una semana	R16–R20	Todo lo anterior

Criterio de salida: todas las pruebas del **documento 04 · Plan de pruebas y aceptación** en verde, o con desvío aceptado por escrito.

F4 · UAT con usuarios reales — 14 al 30 de septiembre

Lo ejecutan **asesores de UDEP**, no Novasys. Es la fase que más suele subestimarse.

Paul De Rutte solicitó explícitamente entrevistas con asesores en campo antes de implementar. Esa observación se ejecuta al inicio del UAT: dos jornadas de acompañamiento presencial o remoto para contrastar el flujo diseñado con el trabajo real.

Criterio de salida: acta de aceptación firmada, con la lista de hallazgos cerrados y los diferidos acordados.

F5 · Capacitación — 21 de septiembre al 2 de octubre

Tres audiencias, tres contenidos distintos: asesores (uso diario), supervisores (monitoreo y reportes) y administradores (configuración, campañas, plantillas). Material base ya existente: **docs/ARIA – Manual de usuario.pdf** y **docs/ARIA – Manual interno (Novasys).pdf**.

F6 · Go-live y estabilización — 5 al 30 de octubre

Arranque escalonado, nunca de golpe:

1. **Piloto (5–9 oct):** un solo programa, un equipo reducido, con Chattigo todavía activo en paralelo.
2. **Corte de Zapier (12–14 oct):** tras confirmar N días de doble ingesta sin pérdida de leads. Se apaga el Zap, no antes.
3. **Producción total (12–16 oct):** todos los programas y todos los asesores.
4. **Hypercare (19–30 oct):** soporte reforzado, revisión diaria de métricas y de la cola de errores.

Criterio de salida: dos semanas de operación sin incidentes de severidad alta y transferencia de conocimiento completada.

5. Ruta crítica

La fecha de go-live depende de esta cadena. Cualquier retraso en un eslabón desplaza el resto día por día:



En ámbar, las tareas cuyo dueño es UDEP. Son cuatro de las siete de la ruta crítica.

6. Alcance diferido (acordado fuera de esta implementación)

Se documentan aquí para que no reaparezcan como "faltantes" durante el UAT:

Ítem	Motivo	Cuándo
Comentarios de Instagram a nivel de aplicación	Requiere App Review de Meta (<code>instagram_manage_comments</code>), plazo fuera del control de ambas partes	Cuando Meta apruebe
Sincronización automática de stages Salesforce ↔ ARIA	Decisión del cliente: el stage se crea primero en Salesforce y se replica a mano	v2
Frecuencia de contacto para el canal de voz	El motor de supresión hoy la aplica a marketing; voz usa la ventana horaria	v2
Pacing predictivo del dialer	Requiere volumen histórico que aún no existe	Tras 2 meses de operación
Múltiples proveedores de identidad simultáneos	El piloto de SSO soporta un IdP configurable	v2

7. Documentos relacionados

Documento	Para qué sirve
documento 02 · Matriz de riesgos	Qué puede salir mal, cuánto duele y qué hacemos al respecto
documento 03 · Análisis de brechas	Qué falta entre lo que hay hoy y lo que UDEP necesita
documento 04 · Plan de pruebas y aceptación	Cómo se verifica que funciona, con criterios de aceptación
documento 05 · Acta de compromisos	Quién entrega qué y en qué fecha
<code>design/go-live-runbook.md</code>	Procedimiento técnico de activación, paso a paso
<code>design/sso-setup-udep.md</code>	Guía de configuración del login federado
